

交通部高速公路局

108年 8 月完成進度摘要表

計畫名稱：國道4號臺中環線豐原潭子段工程

主管單位：第二新建工程處
填表日期：108年9月12日

案號	標案名稱 (承包商名稱)	權重%	契約規定 起訖時間	實際(預估) 起訖時間	本期進度(%)		累計進度(%)			原契約金 額	累計實付 金額	施工情形說明
					預定	實際	預定	實際	比較	變更後金 額	最近一期 估驗日期	
										(百萬元)		
062-C711	國道4號臺中環線豐原潭子 段第C711標豐勢交流道工程 (遠揚營造工程股份有限公司)	15%	106/12/28	106/12/28						2,488	330.18	1. 第一工區：國4既有橋面PCI梁打除(32/76)。 2. 第一工區：國4引道段擋土牆構造物打除及遠運C714標。 3. 第一工區：主線P13基礎鋼筋綁紮、混凝土澆置完成。 4. 第一工區：L1-121明溝施作。 5. 第一工區：RD17-1改道封面，台電管線遷移。 6. 第二工區：主線P18基礎鋼軌樁打設。 7. 第二工區：主線U7 P21-P20場鑄箱梁底腹版鋼筋綁紮、預力套管配置、模版組立。 8. 第二工區：主線P22基礎回填、鋼護座、鋼墩柱二節柱吊裝。 9. 第二工區：主線P24鋼帽梁吊裝。 10. 第二工區：主線P26鋼墩柱二節柱吊裝。 11. 第二工區：匝4P5基礎鋼軌樁打設。 12. 橋樑鋼結構用鋼板進廠檢驗。 13. 交通維持-義交協勤。
			110/07/24	110/07/24	2.01	2.11	21.14	21.24	0.1	2,473	108/6/25	

附表二

C712 標完成進度摘要

規定開工日期	106年3月16日
預定竣工日期	110年5月24日
本期預定進度	2.11%
本期實際進度	1.72%
本期累計預定進度	30.12%
本期累計實際進度	30.63%
超前或落後百分比	0.51%
進度落後原因及改善辦法	

進度調整：依據交通部高公局二處 108/1/4 二二字第 1073960693 號函同意調整 S-Curve 進度表(暫行版)。

圖道4號臺中環線豐原潭子段C712標豐原1號、2號隧道及中坑溪橋工程
施工進度曲線表

工程名稱：圖道4號臺中環線豐原潭子段C712標豐原1號、2號隧道及中坑溪橋工程
工程地點：臺中市豐原區

(修正2版)

項次	工作項目	金額 (千元)	單項佔總 工程 百分比%	106												107												108												109												110											
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5									
甲一	設計部分																																																														
A	路工工程	132,486	4.81	[Progress bar]																																																											
B	橋梁及結構物工程	207,853	7.54	[Progress bar]																																																											
C	排水工程	37,407	1.36	[Progress bar]																																																											
D	交通工程	9,277	0.34	[Progress bar]																																																											
E	邊坡植草、種樹及移植工程	4,752	0.17	[Progress bar]																																																											
F	地質鑽探與試驗	1,901	0.07	[Progress bar]																																																											
G	公路照明預埋管線及箱涵照明工程	525	0.02	[Progress bar]																																																											
H	交控系統土水管道及鋼結構工程	5,191	0.19	[Progress bar]																																																											
I	路堤及橋梁電力預埋管線工程	2,464	0.09	[Progress bar]																																																											
J	雜項工程	62,987	2.28	[Progress bar]																																																											
K	隧道工程	2,093,345	75.94	[Progress bar]																																																											
L	隧道東河口機房工程	33,497	1.22	[Progress bar]																																																											
二	按日計酬部分	12,375	0.45	[Progress bar]																																																											
三	安全衛生費	21,471	0.78	[Progress bar]																																																											
四	環境保護費	50,147	1.82	[Progress bar]																																																											
五	施工期間運輸道路維護	46,751	1.70	[Progress bar]																																																											
六	交通維持	9,318	0.34	[Progress bar]																																																											
七	品質費用	24,866	0.90	[Progress bar]																																																											
小計		2,756,614	100	[Progress bar]																																																											
八	承商利稅、保險及管理費(甲一~甲七)8%	220,529		[Progress bar]																																																											
九	加值營業稅(甲一~甲八)5%	148,857		[Progress bar]																																																											
總計		3,126,000		[Progress bar]																																																											
預定完成金額(萬元)		0	0	118	118	113	551	725	963	1,230	1,559	1,863	1,882	1,949	2,000	2,270	3,023	3,121	3,570	4,110	4,866	5,420	7,040	6,161	3,248	6,309	6,487	6,639	6,594	6,423	6,608	6,629	6,642	6,725	6,668	6,529	4,050	6,769	6,671	7,237	7,252	7,270	7,252	7,267	7,256	8,918	17,395	21,235	16,922	20,516	20,462	18,863											
預定累計完成金額(萬元)		0	0	118	236	349	900	1,625	2,588	3,818	5,377	7,240	9,122	11,071	13,071	15,341	18,364	21,485	25,055	29,165	33,971	39,391	46,431	51,884	55,132	61,441	67,898	74,537	81,131	87,554	94,162	100,791	107,460	114,128	120,736	127,265	131,315	138,084	144,755	151,992	159,244	166,514	173,766	181,033	188,289	197,207	214,602	235,837	252,759	273,275	293,737	312,600											
預定每月完成進度(%)		0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.20	0.27	0.35	0.45	0.57	0.68	0.69	0.71	0.73	0.83	1.11	1.14	1.31	1.50	1.76	1.98	2.58	1.97	1.04	2.02	2.07	2.12	2.11	2.05	2.11	2.12	2.12	2.15	2.11	2.09	1.30	2.17	2.13	2.32	2.32	2.32	2.32	2.85	5.56	6.79	5.41	6.56	6.55	6.04													
預定累計完成進度(%)		0.00	0.00	0.04	0.08	0.12	0.32	0.59	0.94	1.39	1.96	2.64	3.33	4.04	4.77	5.60	6.71	7.85	9.16	10.66	12.42	14.40	16.98	16.60	17.64	19.66	21.73	23.83	25.96	28.01	30.12	32.24	34.36	36.51	38.62	40.71	42.01	44.18	46.31	48.63	50.95	53.28	55.60	57.92	60.24	63.09	68.65	75.44	80.83	87.41	93.96	100.00											
每月實際完成進度(%)		0.00	0.02	0.05	0.05	0.09	0.22	0.27	0.23	1.14	0.38	0.32	0.58	0.72	0.72	0.83	1.11	1.20	1.27	1.46	1.57	1.62	1.73	1.87	0.92	1.71	3.48	2.11	1.60	1.64	1.72																																
每月實際累計完成進度(%)		0.00	0.02	0.07	0.12	0.21	0.43	0.70	0.93	2.07	2.45	2.77	3.35	4.07	4.79	5.62	6.73	7.93	9.20	10.66	12.23	13.85	15.58	17.45	18.37	20.08	23.56	25.67	27.27	28.91	30.63																																
實際累計超前或落後(%)																																																															
累計使用工期百分比(%)		1.05%	3.00%	5.03%	6.99%	9.01%	11.04%	13.00%	15.02%	16.98%	19.01%	21.03%	22.86%	24.89%	26.85%	28.87%	30.83%	32.85%	34.88%	36.84%	38.86%	40.82%	42.85%	44.87%	46.70%	48.73%	50.69%	52.71%	54.67%	56.69%	58.72%																																

附表二

C713 標完成進度摘要

規定開工日期	106 年 11 月 20 日
預定竣工日期	110 年 6 月 21 日
本期預定進度	3.04%
本期實際進度	3.04%
本期累計預定進度	28.42%
本期累計實際進度	28.19%
超前或落後百分比	-0.23%
進度落後原因及改善辦法	<p>落後原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 因民眾陳情表示隧道開炸及大型施工車輛行駛影響生活品質與夜間睡眠，要求施工單位改善，致夜間無法以開炸方試進行開挖，影響工率。 2. 隧道開挖面地質條件隨開挖長度增加而更加惡化，為維安全致使輪進時間增加工率下降。 3. 路堤段受天候及施工人員不足影響，結構物進度落後，致部份可供回填區域尚未完成，影響隧道開挖土方去化。 4. 路堤段及橋樑工程露天作業因受天候下雨影響致使可工作時間縮短。 <p>改善辦法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 東、西洞口因民眾陳請，調整工序後隧道晚上 9 點至翌日 7 點不進行開炸作業；晚上 10 點至翌日 7 點不進行出渣作業；工程期間中午 12 點半至 13 點暫停所有作業，夜間無法進行輪進開挖，採機械開挖方式，降低受影響程度，於施工安全前提下戮力趲趕。 2. 趕辦路堤區相關構造物及填築進度，以利有效去化隧道開挖土方。 3. 路堤段施作除目前施作之工作面(場鑄鋼筋混凝土格梁邊坡保護、路堤段滾壓填築、橫交排水箱涵及明溝)外，儘速安排懸臂工作車進場施作南坑溪橋 PW1 墩柱懸臂節塊，其他如南坑溪橋 PE1 墩柱、烏牛欄溪橋 PW1 基礎、PW2、PW3、PE2 墩柱昇層鋼筋及模板組立..等)增加人員全力趲趕增加產能外，再增闢穿越箱涵及擋土牆工作面，以追回落之進度。

交通部高速公路局
國道4號臺中環線豐原潭子段第C713標雙層3號標通、南北架橋及高牛欄架橋工程

圖號編號: 062-C713
工程名稱: 國道4號臺中環線豐原潭子段第C713標雙層3號標通、南北架橋及高牛欄架橋工程
工程地點: 臺中市豐原區

實際施工日期: 2017/11/20
預定施工日期: 2017/06/21

Table with columns: 項目 (Item), 單位 (Unit), 金額(萬元) (Amount in 10,000 NT dollars), 累計占總工程百分比 (%) (Cumulative % of total work). Rows include items like 施工工程, 油漆及結構工程, 排水工程, etc.

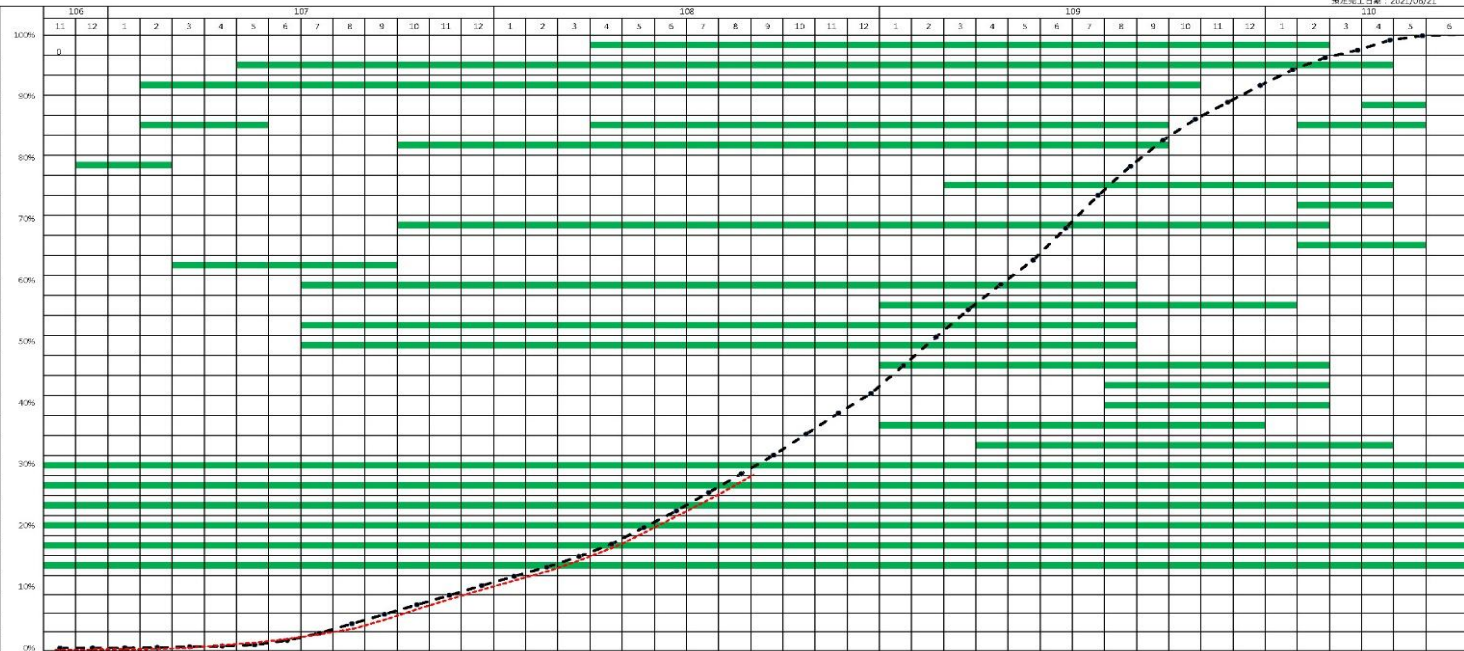


Table with columns: 項目 (Item), 金額(萬元) (Amount in 10,000 NT dollars), 累計占總工程百分比 (%) (Cumulative % of total work). Rows include 前期工程、期間及管理費, 安全稽查費, etc.

Large data table with columns: 日期 (Date), 項目 (Item), 金額(萬元) (Amount in 10,000 NT dollars), 累計占總工程百分比 (%) (Cumulative % of total work). Contains daily progress data.

Summary table with columns: 項目 (Item), 圖號 (Drawing No.), 圖名 (Drawing Name), 圖號 (Drawing No.), 圖名 (Drawing Name), 圖號 (Drawing No.), 圖名 (Drawing Name). Includes drawing codes and names.

7715D/108年8月監造月報

附表二

C714 標完成進度摘要

規定開工日期	106/12/28
預定竣工日期	111/1/9
本期預定進度	2.34%
本期實際進度	1.89%
本期累計預定進度	26.01%
本期累計實際進度	25.57%
超前或落後百分比	-0.44%
進度落後原因及改善辦法	<p>落後原因：本月份因懸臂工作車事故造成停工、颱風來襲及豪大雨影響。</p> <p>改善辦法：積極溝通協調勞檢提送事故檢討及復工計畫，預定 9/5 能速獲核准復工。安排主線 U4 上構場撐準備進場施作、豐原連絡道臨時堤防設置及復舊與 A1 橋台積裝機具提早進場準備施工、環 2P16 懸臂柱頭、環 3P8~P9 及環 4P2~P1 邊跨進場準備施工。</p>

附表二

C715 標完成進度摘要

規定開工日期	<u>107.02.25</u>
預定竣工日期	<u>109.10.16</u>
本期預定進度	<u>4.22%</u>
本期實際進度	<u>3.66%</u>
本期累計預定進度	<u>38.39%</u>
本期累計實際進度	<u>38.87%</u>
超前或落後百分比	<u>+0.48%</u>
進度落後 原因及改善辦法	

