

交通部高速公路局

108年 9 月完成進度摘要表

計畫名稱：國道4號臺中環線豐原潭子段工程

主管單位：第二新建工程處
填表日期：108 年 12 月 13日

案號	標案名稱 (承包商名稱)	權重%	契約規定 起訖時間	實際(預估) 起訖時間	本期進度(%)		累計進度(%)			原契約金 額	累計實付 金額	施工情形說明
					預定	實際	預定	實際	比較	變更後金 額	最近一期 估驗日期	
										(佰萬元)		
062-C711	國道4號臺中環線豐原潭子 段第C711標豐勢交流道工程 (遠揚營造工程股份有限公司)	15%	106/12/28	106/12/28						2,488	720.27	1. 國4引道段擋土牆構造物拆除及遠運C713。 2. 主線P4-P5既有墩柱水刀拆除。 3. 主線P9E1/W1基樁施作。 4. 主線P13墩柱昇層施作。 5. 匝4P5、匝4P6墩柱施作。 6. 匝3 P7~P8 U2場撐完成。
			111/02/02	111/02/02	3.01	3.01	29.82	30.32	0.5	2,543	108/11/30	7. 主線P17基礎鋼軌樁打設。 8. 主線P18墩柱昇層施作。 9. 主線U7 P20-P19場鑄箱梁施作。 10. 主線P22鋼結構帽梁吊裝完成。 11. 主線PW23鋼結構一節柱吊裝完成。 12. 主線PW28基礎完成，鋼墩柱施作中。

交通部高速公路局
C711標分月預定進度表

8

附表二


C712 標完成進度摘要

規 定 開 工 日 期	106 年 3 月 16 日
預 定 竣 工 日 期	110 年 5 月 24 日
本 期 預 定 進 度	2.15%
本 期 實 際 進 度	2.59%
本期累計預定進度	36.51%
本期累計實際進度	37.15%
超前或落後百分比	+0.64%
進 度 落 後 原 因 及 改 善 辦 法	

進度調整：依據交通部高公局二處 108/1/4 二二字第 1073960693 號函同意調整 S-Curve 進度表(暫行版)。

國道4號臺中環線豐原潭子段C712標豐原1號、2號隧道及中坑溪橋工程
施工進度曲線表

工程名稱：國道4號臺中環線豐原潭子段C712標豐原1號、2號隧道及中坑溪橋工程
工程地點：臺中市豐原區

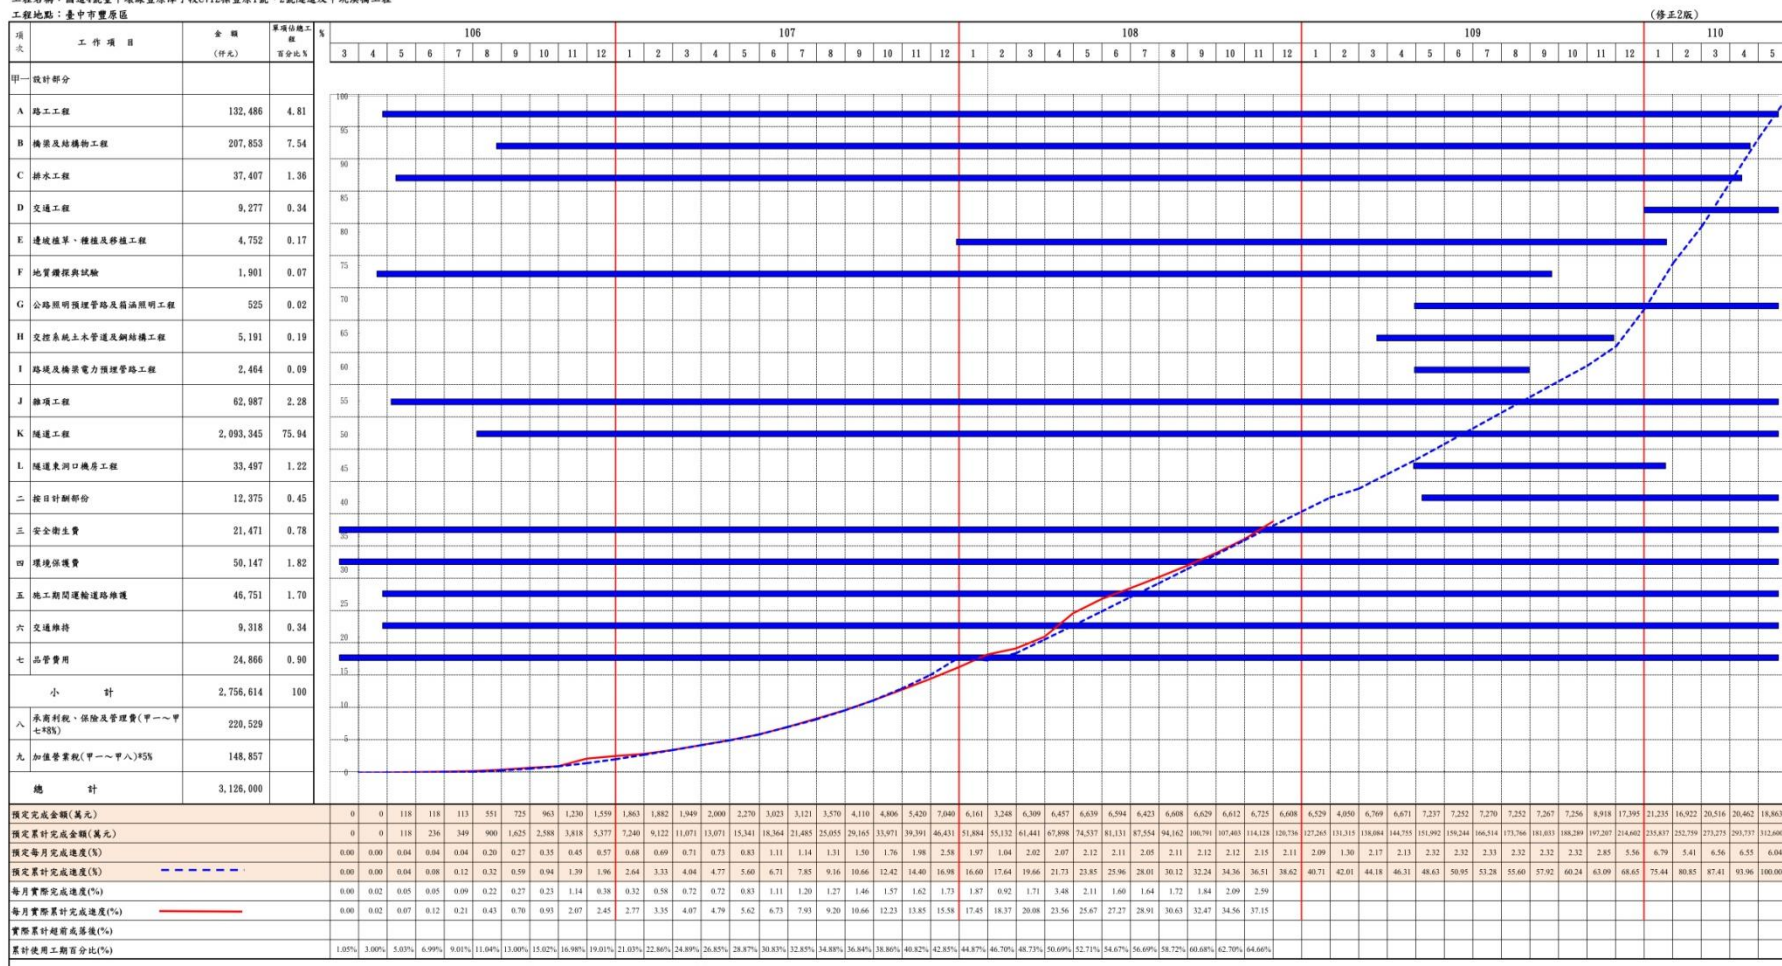

附表二

C713 標完成進度摘要

規 定 開 工 日 期	106 年 11 月 20 日
預 定 竣 工 日 期	110 年 7 月 29 日
本 期 預 定 進 度	2.30%
本 期 實 際 進 度	2.19%
本期累計預定進度	33.60%
本期累計實際進度	35.27%
超前或落後百分比	+1.67%
進 度 落 後 原 因 及 改 善 辦 法	

年 11 月監造月報

附表二


C714 標完成進度摘要

規 定 開 工 日 期	106/12/28
預 定 竣 工 日 期	111/1/9
本 期 預 定 進 度	2.69%
本 期 實 際 進 度	2.80%
本期累計預定進度	33.55%
本期累計實際進度	32.97%
超前或落後百分比	-0.58%
進 度 落 後 原 因 及 改 善 辦 法	落後原因：因 8 月份懸臂工作車事故造成停工、颱風來襲及豪大雨影響。 改善辦法：已於 9/4 獲核准復工。積極安排主線U4上構場撐進場施作整地、豐原連絡道臨時堤防設置及復舊與A1橋台基樁進場施工、環2P16懸臂柱頭、環3P8~P9及環4P2~P1邊跨進場施工，9月份、10月份及當月進度皆已超前當月預定進度，工地預定12月份可增加潭子連絡道p1下構基樁工作、主線P8、P17、P21、環1P2懸臂節塊開始量產及主線U4場撐P12~13上構箱梁施作等作業以挹注產能，預定12月份可趕回預定累計進度。

交通部高速公路局
S-Curve進度表(第一次工期展延修訂版)

工程合約編號：062-C714
工程合約名稱：國道4號臺中環線豐原潭子段第C714標潭子交流道工程
工程地點：梧棲24K+994至27K+289

版次：
修訂日期：108.08.20

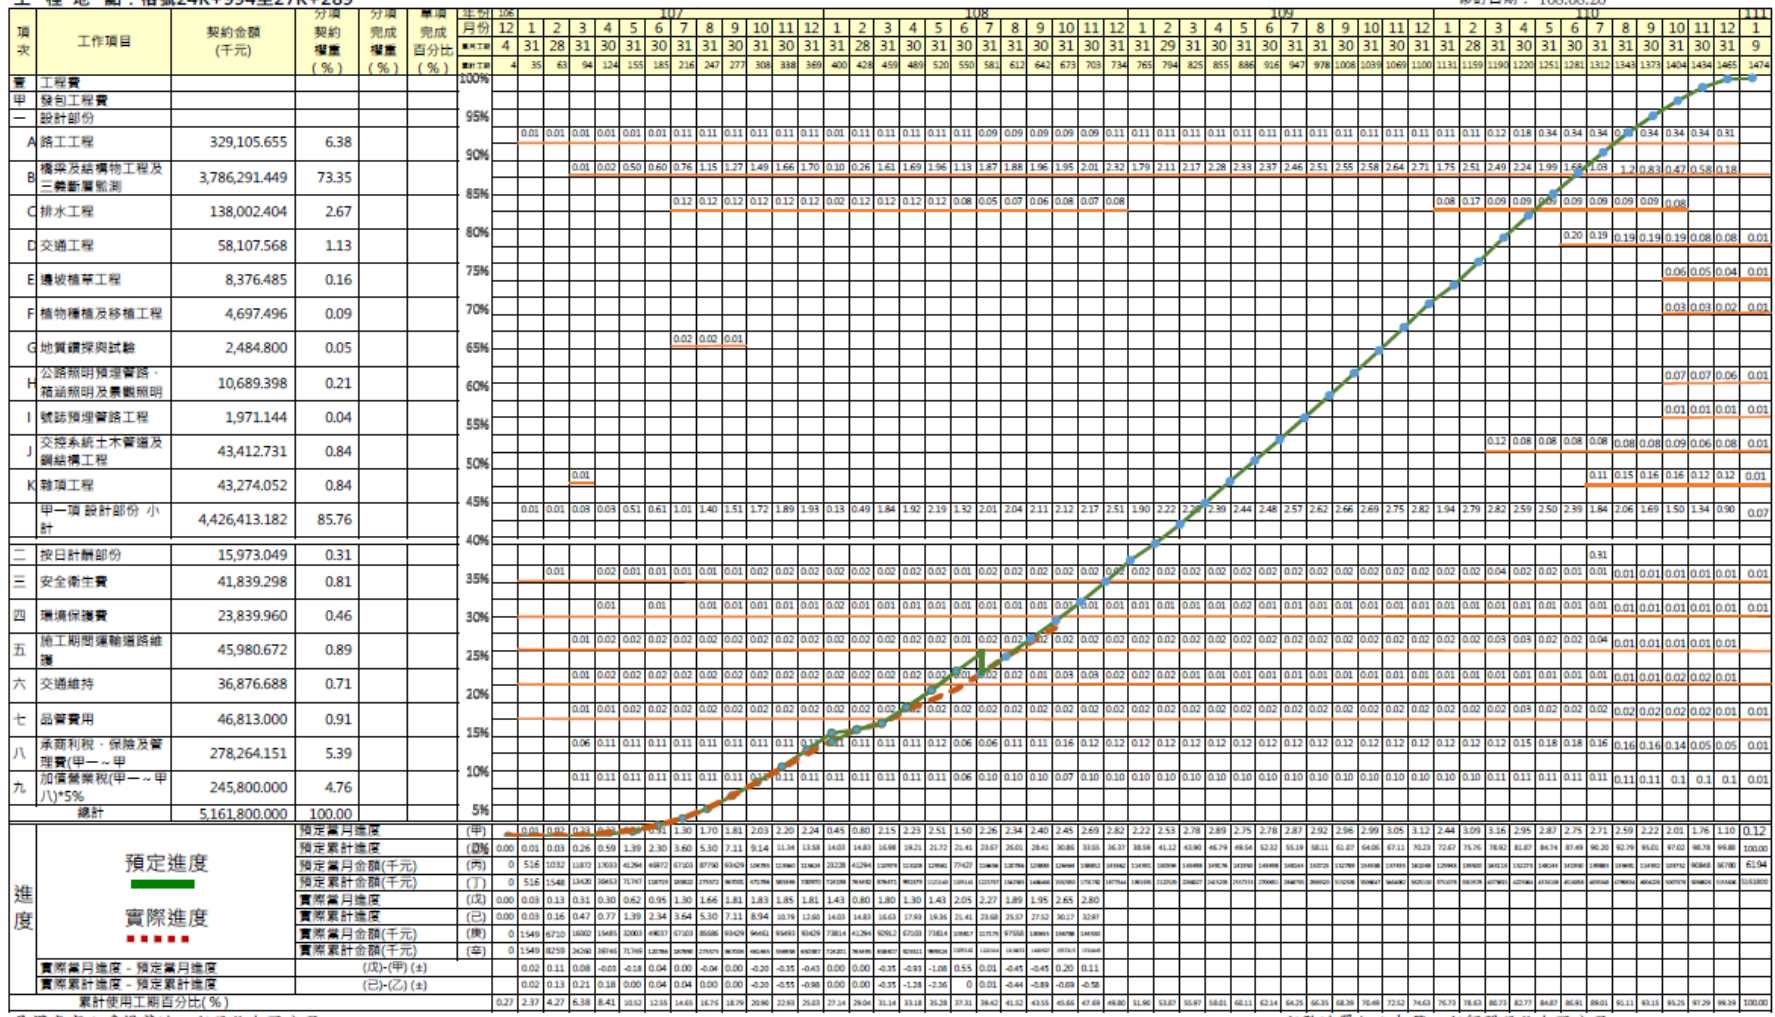

承攬廠商：遠揚營造工程股份有限公司

工程監造單位：中興工程顧問股份有限公司

附表二

C715 標完成進度摘要

<u>規 定 開 工 日 期</u>	<u>107.02.25</u>
<u>預 定 竣 工 日 期</u>	<u>109.10.16</u>
<u>本 期 預 定 進 度</u>	<u>4.81%</u>
<u>本 期 實 際 進 度</u>	<u>5.44%</u>
<u>本期累計預定進度</u>	<u>52.23%</u>
<u>本期累計實際進度</u>	<u>52.91%</u>
<u>超前或落後百分比</u>	<u>+0.68%</u>
<u>進 度 落 後 原 因 及 改 善 辦 法</u>	

預定施工進度曲線表

開工日期：107年02月25日

7715D/108 年 11 月監造月報
