


# 交通部高速公路局 C711標分月預定進度表

附表二

合約編號：062-C711 工程名稱：國道4號臺中環線豐原段C711標電力交通工程 工程地點：臺中市豐原區			106												107												108												109												110												111	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
項次	工作項目	金額(仟元)																																																														
甲一	設計部分																																																															
A	路工程口	112,440																																																														
B	結構工程	1,785,379																																																														
C	排水工程口	50,977																																																														
D	交通工程	27,266																																																														
E	邊坡植草、種植及修補工程	11,167																																																														
F	地質鑽探與試驗	217																																																														
G	公路照明預埋管線及箱涵照明工程	3,047																																																														
H	交控系統土木管線及鋼結構工程	22,272																																																														
I	號誌預埋管線工程	1,445																																																														
J	雜項工程	44,683																																																														
K	新闢臨時調便橋便道	63,163																																																														
二	按日計酬部份	8,823																																																														
三	安全衛生費	29,909																																																														
四	環境保護費	14,108																																																														
五	施工期間護輪胎路維護	30,238																																																														
六	交通維持	54,367																																																														
七	品質費用	25,550																																																														
小計																																																																
八	承商利稅、保險及管理費(甲~甲七)*6%	137,103																																																														
九	加值營業稅(甲~甲八)*5%	121,108																																																														
總計																																																																
本月預定完成金額(仟元)			0	0	254	255	9664	12971	16277	24161	26704	34334	36623	40438	40946	15425.6	15256.4	30520	37386	58749	61547	65616	51119	70957	73246	76551	80875	52137	56969	61801	62310	64854	68413	63327	70449	72483	72483	72737	73246	70957	59258	71720	72483	75335	74772	75026	75335	76043	74009	75026	50611	45525	16276											
本月預定累計完成金額(仟元)			0	0	254	509	10173	23144	39421	63582	90286	124620	161243	201681	242627	21741.6	232708	263228	300614	359363	420910	486526	537642	608861	681848	758401	839276	891413	948382	1010183	1074931	1137947	1205760	1269087	1339536	1412019	1484502	1557239	1630481	1701442	1767070	1832420	1904901	1980438	2055210	2130236	2205771	2281814	2358252	2430849	2481460	2526985	2543261											
本月實際完成金額(仟元)			0	0	1017	9410	12717	10936	22126	15260	26704	34334	26196	26195	21618	22381	19074	32043	43236	58749	38912	65616	53661	76041	78313	76552	85453																																					
本月實際累計完成金額(仟元)			0	0	1017	10427	23144	34080	56206	71466	98170	132504	158700	184895	206513	228894	247968	280013	323349	381998	409100	486526	540189	616232	694561	771117	856570																																					
本月預定完成進度(%)			0.00	0.00	0.01	0.01	0.38	0.51	0.64	0.95	1.05	1.35	1.44	1.59	1.61	0.62	0.41	1.20	1.47	2.31	2.42	2.58	2.01	2.79	2.86	3.01	3.18	2.05	2.24	2.43	2.45	2.55	2.69	2.49	2.77	2.85	2.85	2.86	2.88	2.79	2.33	2.82	2.85	2.97	2.94	2.95	2.97	2.99	2.91	2.95	1.99	1.79	0.64											
本月預定累計完成進度(%)			0.00	0.00	0.01	0.02	0.40	0.91	1.55	2.50	3.55	4.90	6.34	7.93	9.54	8.74	9.15	10.35	11.81	14.13	16.55	19.13	21.14	23.93	26.81	29.82	33.00	36.05	37.29	39.72	42.17	44.72	47.41	49.90	52.67	55.52	58.37	61.23	64.11	66.90	69.23	72.05	74.90	77.87	80.81	82.76	86.73	89.72	92.63	95.58	97.57	90.36	100.00											
本月實際完成進度(%)			0.00	0.00	0.04	0.37	0.50	0.43	0.87	0.60	1.05	1.35	1.03	1.03	0.85	0.88	0.75	1.26	1.70	2.31	1.53	2.58	2.11	2.99	3.08	3.01	3.36																																					
本月實際累計完成進度(%)			0.00	0.00	0.04	0.41	0.91	1.34	2.21	2.81	3.86	5.21	6.24	7.27	8.12	9.00	9.75	11.01	12.71	15.02	16.55	19.13	21.24	24.23	27.31	30.32	33.68																																					
落後或超前(%)			0.00	0.00	0.03	0.39	0.51	0.43	0.66	0.31	0.31	0.31	-0.10	-0.66	-1.42	0.26	0.60	0.66	0.89	0.89	0.00	0.00	0.10	0.30	0.50	0.50	0.68																																					
圖例： 																																																																
承攬廠商：遠揚營造工程股份有限公司																																																																
																																																															開工日期：106年12月28日 完工日期：111年2月2日	
																																																															工程監造單位：高公局第二新建工程處材料試驗所	

附表二

C712 標完成進度摘要


規定開工日期	106年3月16日
預定竣工日期	110年5月24日
本期預定進度	2.11%
本期實際進度	2.32%
本期累計預定進度	38.62%
本期累計實際進度	39.47%
超前或落後百分比	+0.85%
進度落後原因及改善辦法	

進度調整：依據交通部高公局二處 108/1/4 二二字第 1073960693 號函同意調整 S-Curve 進度表(暫行版)。

國道4號臺中環線豐原潭子段C712標豐原1號、2號隧道及中坑溪橋工程  
 施工进度曲线表

工程名稱：國道4號臺中環線豐原潭子段C712標豐原1號、2號隧道及中坑溪橋工程  
 工程地點：臺中市豐原區

(修正2版)

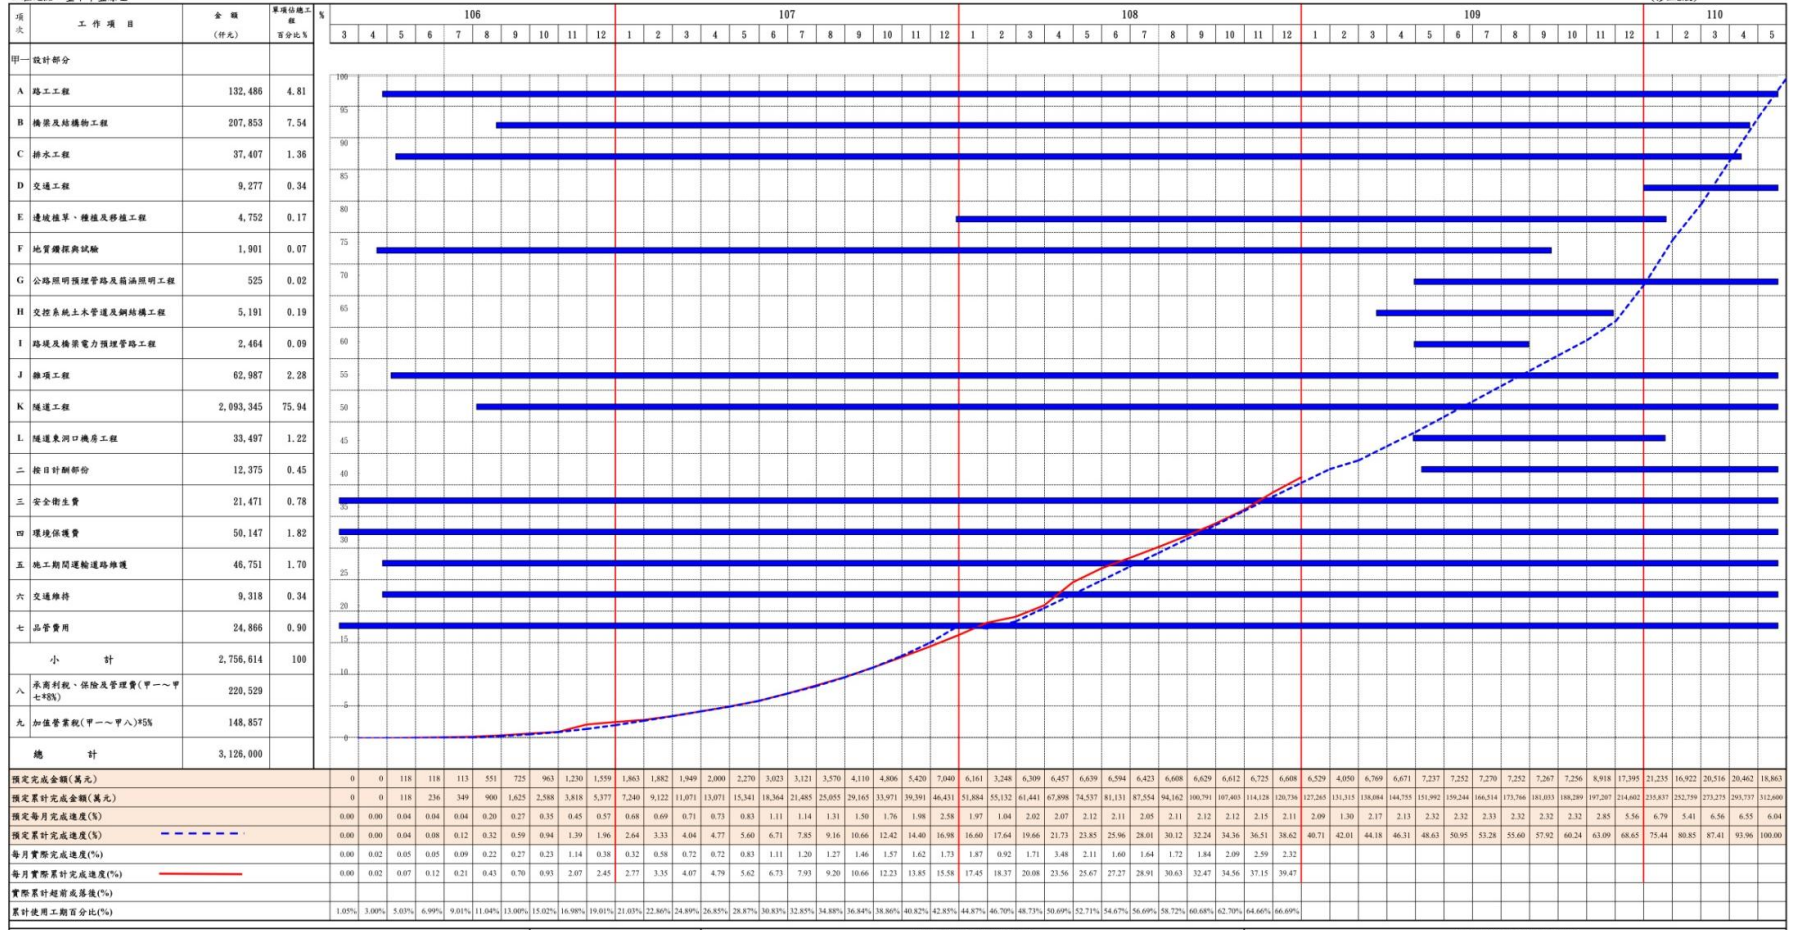


附表二

C713 標完成進度摘要

規定開工日期	106 年 11 月 20 日
預定竣工日期	110 年 7 月 29 日
本期預定進度	2.29%
本期實際進度	2.22%
本期累計預定進度	35.89%
本期累計實際進度	37.49%
超前或落後百分比	+1.60%
進度落後 原因及改善辦法	

交通部高速公路局  
國道4號臺中環線潭子段第C713標單第3號標區、南坑溪橋及烏牛欄溪橋工程

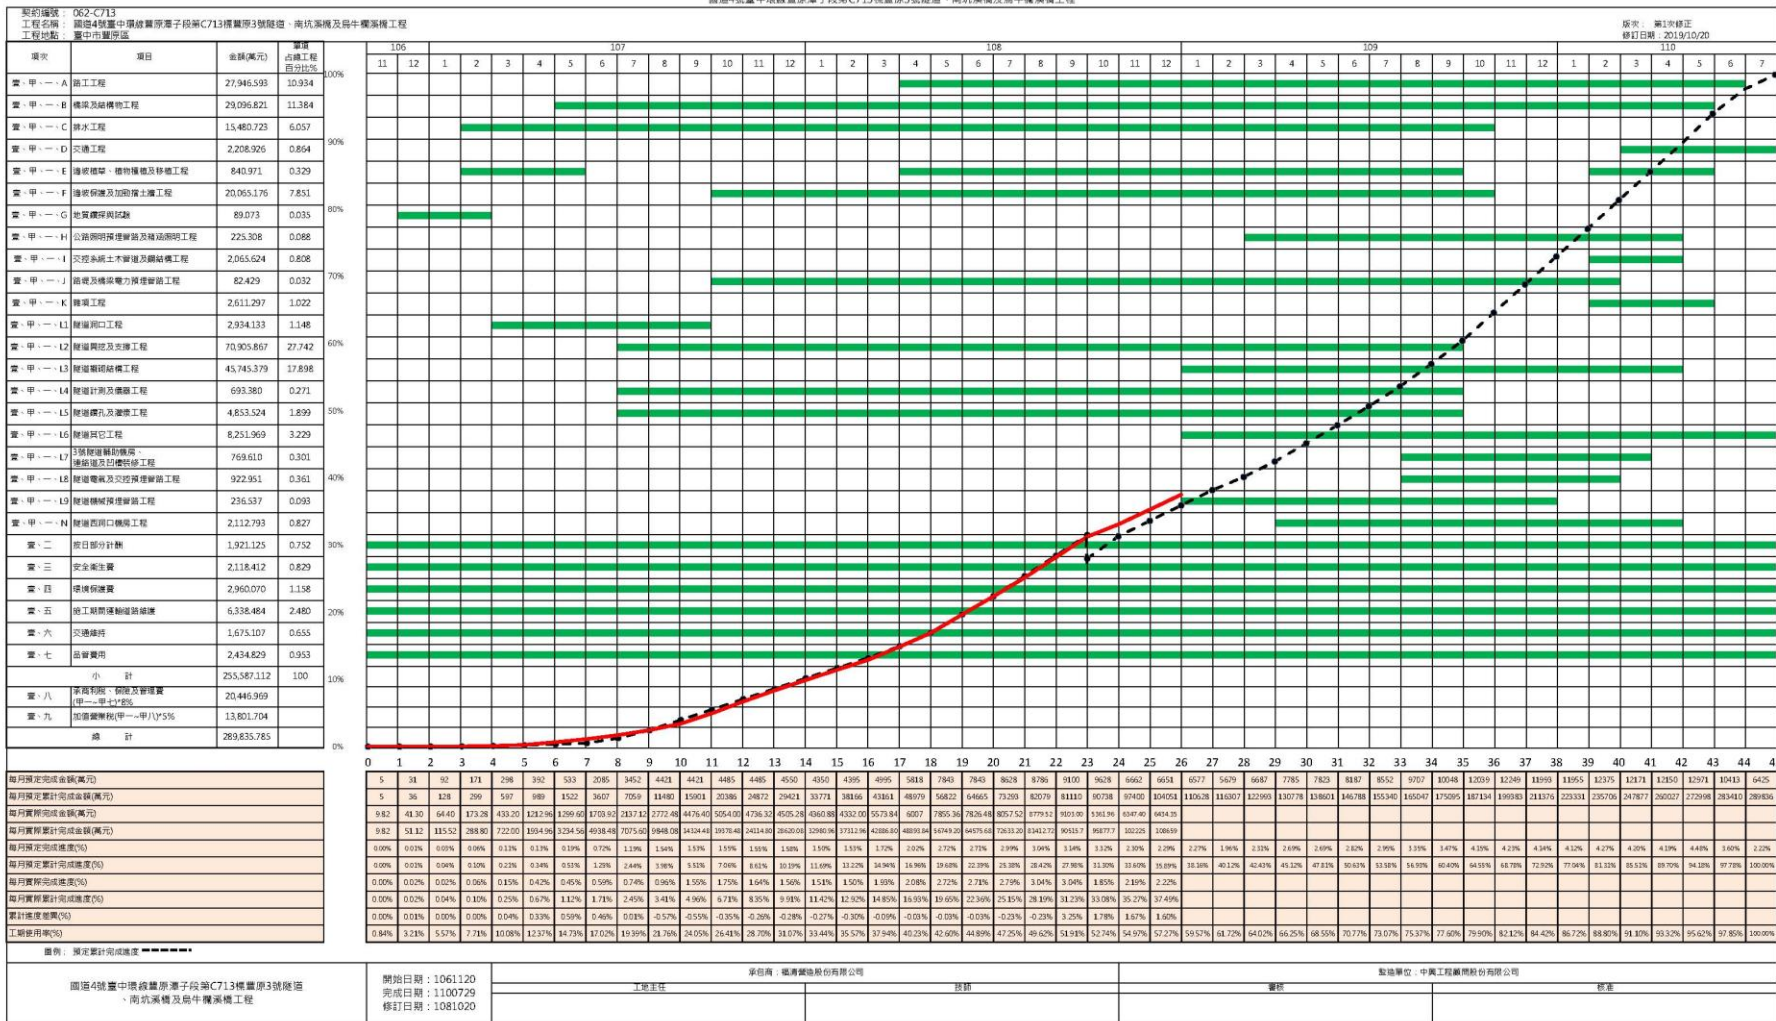

附表二

C714 標完成進度摘要

規定開工日期	106/12/28
預定竣工日期	111/1/9
本期預定進度	2.82%
本期實際進度	3.41%
本期累計預定進度	36.37%
本期累計實際進度	36.38%
超前或落後百分比	+0.01%
進度落後 原因及改善辦法	



交通部高速公路局 S-Curve進度表(第一次工期展延修訂版)

工程合約編號：062-C714 工程合約名稱：國道4號臺中環線豐原潭子段第C714標潭子交流道工程 工程地點：橋號24K+994至27K+289

版次： 修訂日期：108.08.20

Table with columns for work items (e.g., 設計工程, 路工工程, 橋梁工程) and progress percentages (1 to 1474). Includes summary rows for contract total and progress comparison (預定 vs 實際).

承攬廠商：遠揚營造工程股份有限公司

工程監造單位：中興工程顧問股份有限公司

附表二

C715 標完成進度摘要

規定開工日期	<u>107.02.25</u>
預定竣工日期	<u>109.10.16</u>
本期預定進度	<u>4.69%</u>
本期實際進度	<u>4.07%</u>
本期累計預定進度	<u>56.93%</u>
本期累計實際進度	<u>56.98%</u>
超前或落後百分比	<u>+0.05%</u>
進度落後 原因及改善辦法	



國道4號臺中環線豐原潭子段第C715標潭子系統交流道工程

預定施工進度曲線表

工程名稱：國道4號臺中環線豐原潭子段第C715標潭子系統交流道工程

開工日期：107年02月25日

