

交通部高速公路局

109年2月完成進度摘要表

計畫名稱：國道4號臺中環線豐原潭子段工程

主管單位：第二新建工程處
填表日期：109年3月16日

案號	標案名稱 (承包商名稱)	權重%	契約規定 起訖時間	實際(預估) 起訖時間	本期進度(%)		累計進度(%)			原契約金額	累計實付金額	施工情形說明
					預定	實際	預定	實際	比較	變更後金額	最近一期估驗日期	
										(佰萬元)		
062-C711	國道4號臺中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程 (遠揚營造工程股份有限公司)	15%	106/12/28	106/12/28	2.24	2.67	37.29	38.72	1.43	2,488	955.59	1. 主線P1W1、P3E1~P6E1墩柱植筋。 2. 主線P9E1/W1基礎施作完成。 3. 主線P15墩柱昇層施作。 4. 主線P16基礎鋼軌樁施作。 5. 匝4P5、匝4P6墩柱昇層施作。 6. 匝3 P9-P10 U2場鑄箱梁底板施作。 7. 匝4P3、4P4基樁施作。 8. 主線P17墩柱施作完成。 9. 主線U7 P19-P18場鑄箱梁頂版施作。 10. 主線U8 P25-P26東行線鋼箱梁吊裝。 11. 主線PE28鋼墩柱一節柱吊裝完成。 12. 區域排水施作。 13. 主線PE28基礎回填。
			111/02/02	111/02/02						2,543	109/2/29	

附表二

C712 標完成進度摘要


規 定 開 工 日 期	106 年 3 月 16 日
預 定 竣 工 日 期	110 年 5 月 24 日
本 期 預 定 進 度	1.30%
本 期 實 際 進 度	2.07%
本 期 累 計 預 定 進 度	42.01%
本 期 累 計 實 際 進 度	43.33%
超 前 或 落 後 百 分 比	+1.32%
進 度 落 後 原 因 及 改 善 辦 法	

進度調整：依據交通部高公局二處 108/1/4 二二字第 1073960693 號函同意調整 S-Curve 進度表(暫行版)。

國道4號臺中環線豐原潭子段C712標豐原1號、2號隧道及中坑溪橋工程
施工進度曲線表

工程名稱：國道4號臺中環線豐原潭子段C712標豐原1號、2號隧道及中坑溪橋工程
工程地點：臺中市豐原區

(修正2版)

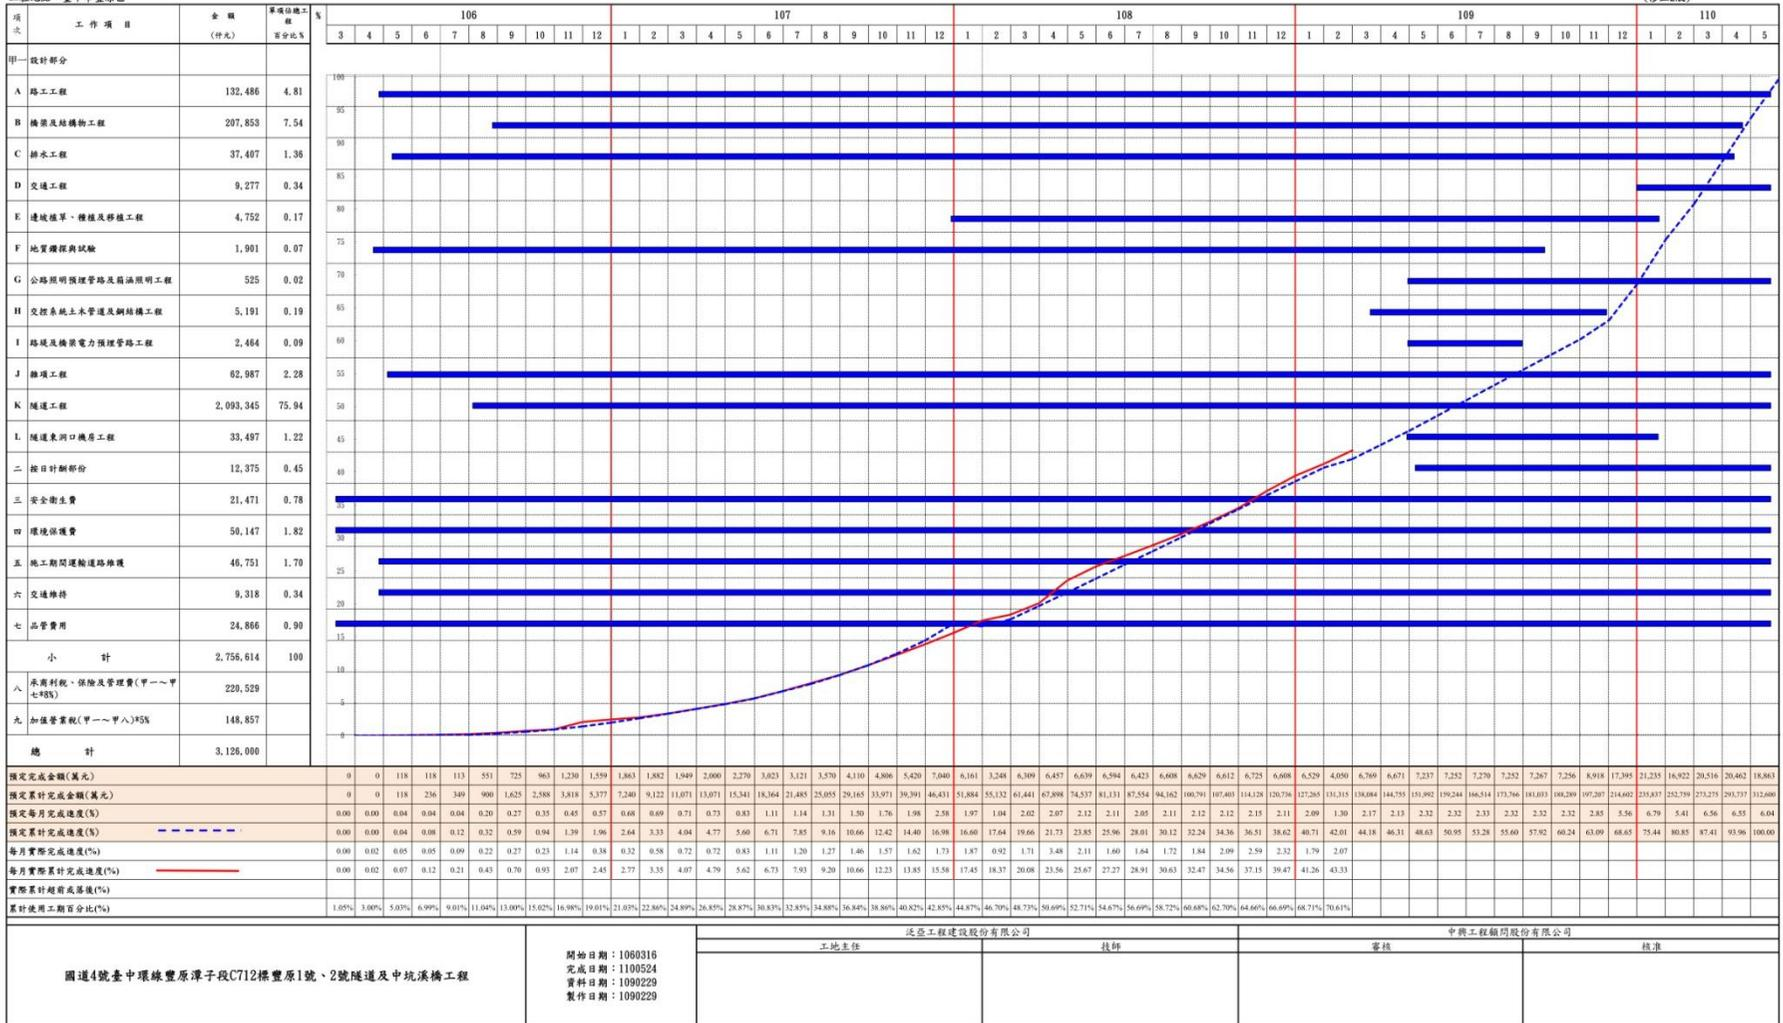

附表二

C713 標完成進度摘要

規定開工日期	106 年 11 月 20 日
預定竣工日期	110 年 7 月 29 日
本期預定進度	1.96%
本期實際進度	1.82%
本期累計預定進度	40.12%
本期累計實際進度	41.48%
超前或落後百分比	+1.36%
進度落後 原因及改善辦法	

附表二

C714 標完成進度摘要

規定開工日期	106/12/28
預定竣工日期	111/1/9
本期預定進度	2.53%
本期實際進度	2.54%
本期累計預定進度	41.12%
本期累計實際進度	41.20%
超前或落後百分比	+0.08%
進度落後 原因及改善辦法	

交通部高速公路局


S-Curve進度表(第一次工期展延修訂版)

工程合約編號：062-C714

工程合約名稱：國道4號臺中環線豐原潭子段第C714標潭子交流道工程

工程地點：橋號24K+994至27K+289

版次：
修訂日期：108.08.20

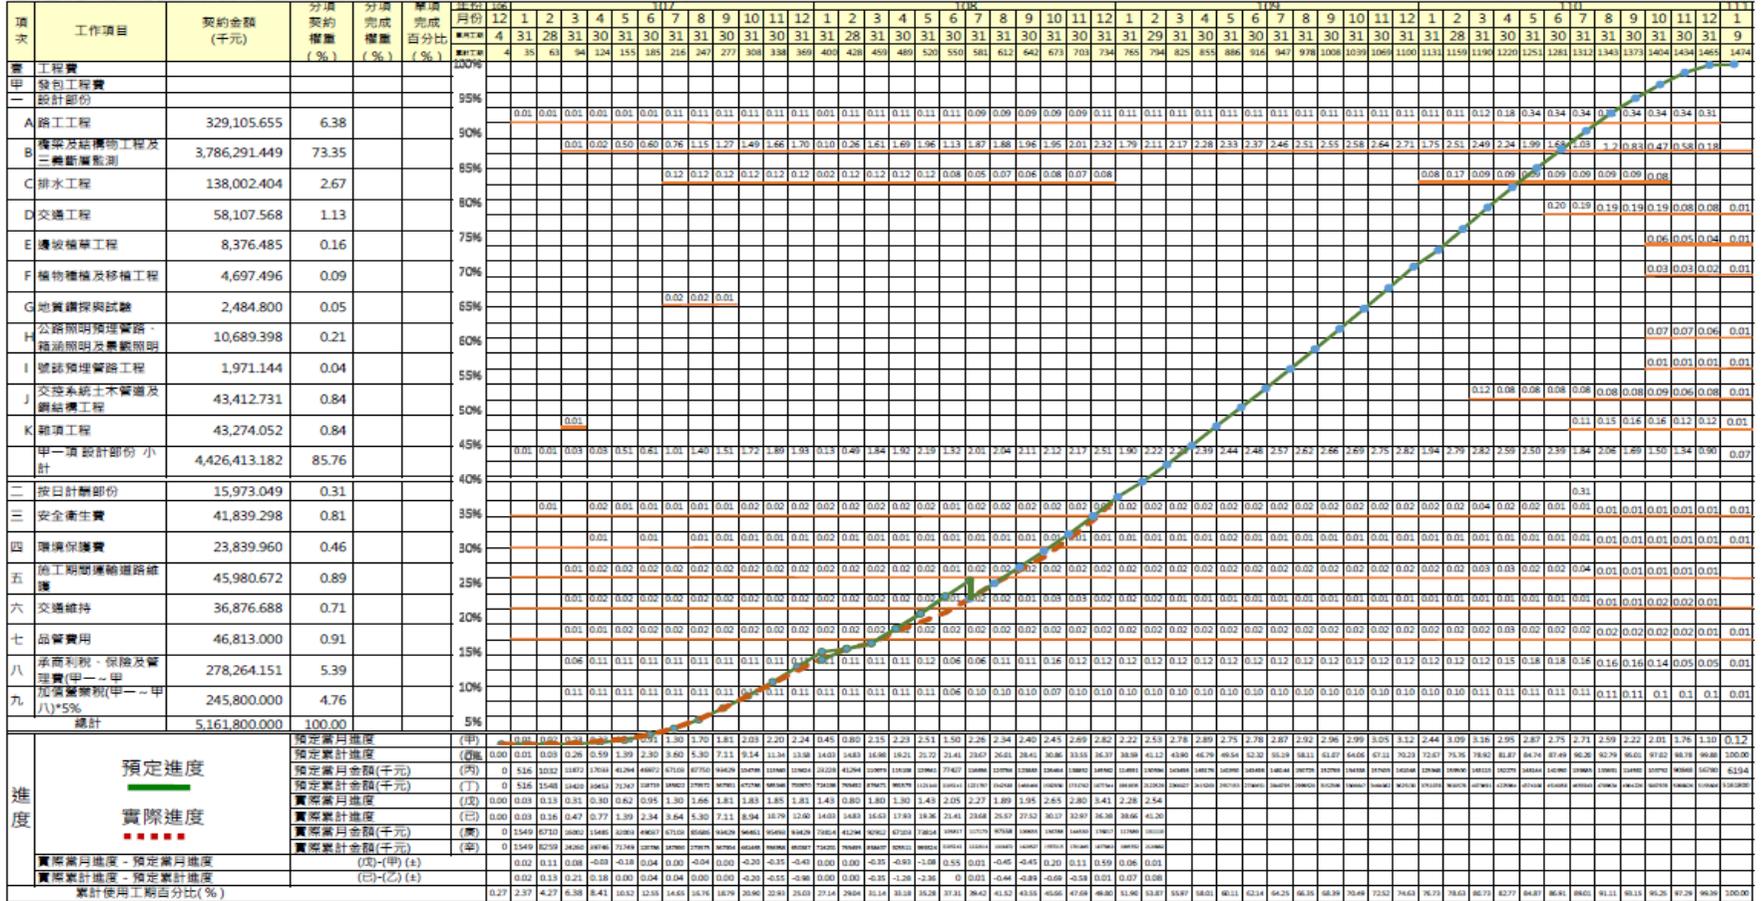

承攬廠商：遠揚營造工程股份有限公司

工程監造單位：中興工程顧問股份有限公司

附表二

C715 標完成進度摘要

規定開工日期	<u>107.02.25</u>
預定竣工日期	<u>109.10.16</u>
本期預定進度	<u>3.78%</u>
本期實際進度	<u>3.77%</u>
本期累計預定進度	<u>65.33%</u>
本期累計實際進度	<u>65.34%</u>
超前或落後百分比	<u>+0.01%</u>
進度落後 原因及改善辦法	

