

交通部高速公路局

工程標準作業程序

程序編號：局 09070

版本：5

程序名稱：停工、復工及展延

核 准：

日期：

趙興華

113.9.3

### 1.0 目的

藉由標準之作業程序使停工、復工及展延申請作業標準化。

### 2.0 範圍

適用於本局巨額以上且已簽發” 開工通知書” 之工程。

### 3.0 定義

3.1 完工期限：載明於契約文件上，規定完成契約工程或工作之時限或日期，由開工日期起算，並包含核准展延之工期。

3.2 停工：為經工程司書面通知之暫停全部或其任何部份契約工程項目。

### 4.0 參考文件

4.1 交通部高速公路局「交通部高速公路局與所屬機關權責劃分」。

4.2 交通部高速公路局「一般條款」。

### 5.0 說明

5.1 本程序之作業流程，如局流程 09070。

5.2 因工程需要或其他原因，本局各分局依權責簽發「工程停(復)工通知書」(局附件 09070A)通知承包商停(復)工，該通知正本函送承包商依規定辦理，副本分送高公局、工務段(所)及監造單位。

5.3 承包商接獲” 工程停(復)工通知書” 後，應依契約規定立即辦理停工或復工，填具「工程停工報告表」(局表 09070A-1)或「工程復工報告表」(局表 09070A-2)，如符工期展延規定者並申辦工期展延相關手續。

- 5.4 承包商接獲“工程停（復）工通知書”，或因契約變更而增加工程數量，或受其他不屬承包商責任之原因影響，致無法在契約完工期限內完成，而須展延工期時，須於契約規定期限內分別填報「工期展延申請總表」（局表 09070B）、「承包商申請工期展延詳細說明及計算書」（局表 09070D）、「施工計畫網狀圖」及其他佐證資料等書面文件共 3 份，說明事實理由與申請工期展延，送監造單位審查。該申請展延期限可待復工或影響施工之原因消失時再行補充說明。
- 5.5 承包商申請工期展延之有效理由應依本局「一般條款」或「特訂條款」規定辦理。
- 5.6 監造單位於審查承包商提送之工期展延文件及資料時，需填寫「工期展延審核意見表」（局表 09070C）3 份，併「工期展延申請總表」及「承包商申請工期展延詳細說明及計算書」提報工務段（所）。
- 5.7 工務段（所）初核後，另填「工期展延審核意見表」陳報分局。
- 5.8 分局於複核工務段（所）提報之書面資料後，另填「工期展延審核意見表」報局核定。若屬分局簽約案件由分局核定。
- 5.9 本局核定後，正本函送承包商，副本分送相關單位。
- 5.10 因契約變更而調整工期者，除依上述規定提報工期展延相關表格及資料外，其他應依「契約變更」程序（局 09080）辦理。
- 5.11 上項工期之展延視為工程契約之一部份。
- 5.12 各分局應於每年 1、5 及 9 月第一週將所轄範圍前 4 個月所有查核金額以上工程之停工、復工及展延工期（資料截止日為每年 12、4 及 8 月月底）相關資料彙整分別填入「查核金額以上工程案件停工復工報告表」（局表 09070E）及「查核金額以上採購案件契約展延報告表」（局表 09070F）中，報本局彙整於 15 日前報交通部備查。
- 5.13 若屬自辦監造之工程，流程中監造單位之職掌由工務段（所）承辦。

## 6.0 表格

- 6.1 工程停工報告表（局表 09070A-1）、工程復工報告表（局表 09070A-2）。
- 6.2 工期展延申請總表（局表 09070B）。
- 6.3 工期展延審核意見表（局表 09070C）。
- 6.4 承包商申請工期展延詳細說明及計算書（局表 09070D）。
- 6.5 查核金額以上工程案件停工復工報告表（局表 09070E）。

6.6 查核金額以上採購案件契約展延報告表（局表 09070F）。

## 7.0 附件

7.1 工程停（復）工通知書（局附件 09070A）。

## 8.0 附錄：修正重說明

8.1 104 年 12 月第 3 版修訂內容：

8.1.1 配合本局「交通部臺灣區國道高速公路局與所屬機構權責劃分表」修訂，局版標準作業程序修訂為適用於巨額以上工程。

8.1.2 增訂工務段（所）及工程處填具「工期展延審核意見表」之程序。

8.1.3 其他包括部分文字增修。

8.2 107 年 10 月第 4 版修訂內容：

8.2.1 將「工程停（復）工報告表」（局表 09070A）修正為「工程停工報告表」（局表 09070A-1）及「工程復工報告表」（局表 09070A-2）。


8.2.2 配合本局組織改造修正相關內容。

8.3 113 年 9 月第 5 版修訂內容：

8.3.1 配合交通部組織調整修正相關內容。

8.3.2 局流程、局表及局附件版本，配合本次修訂統一進版。



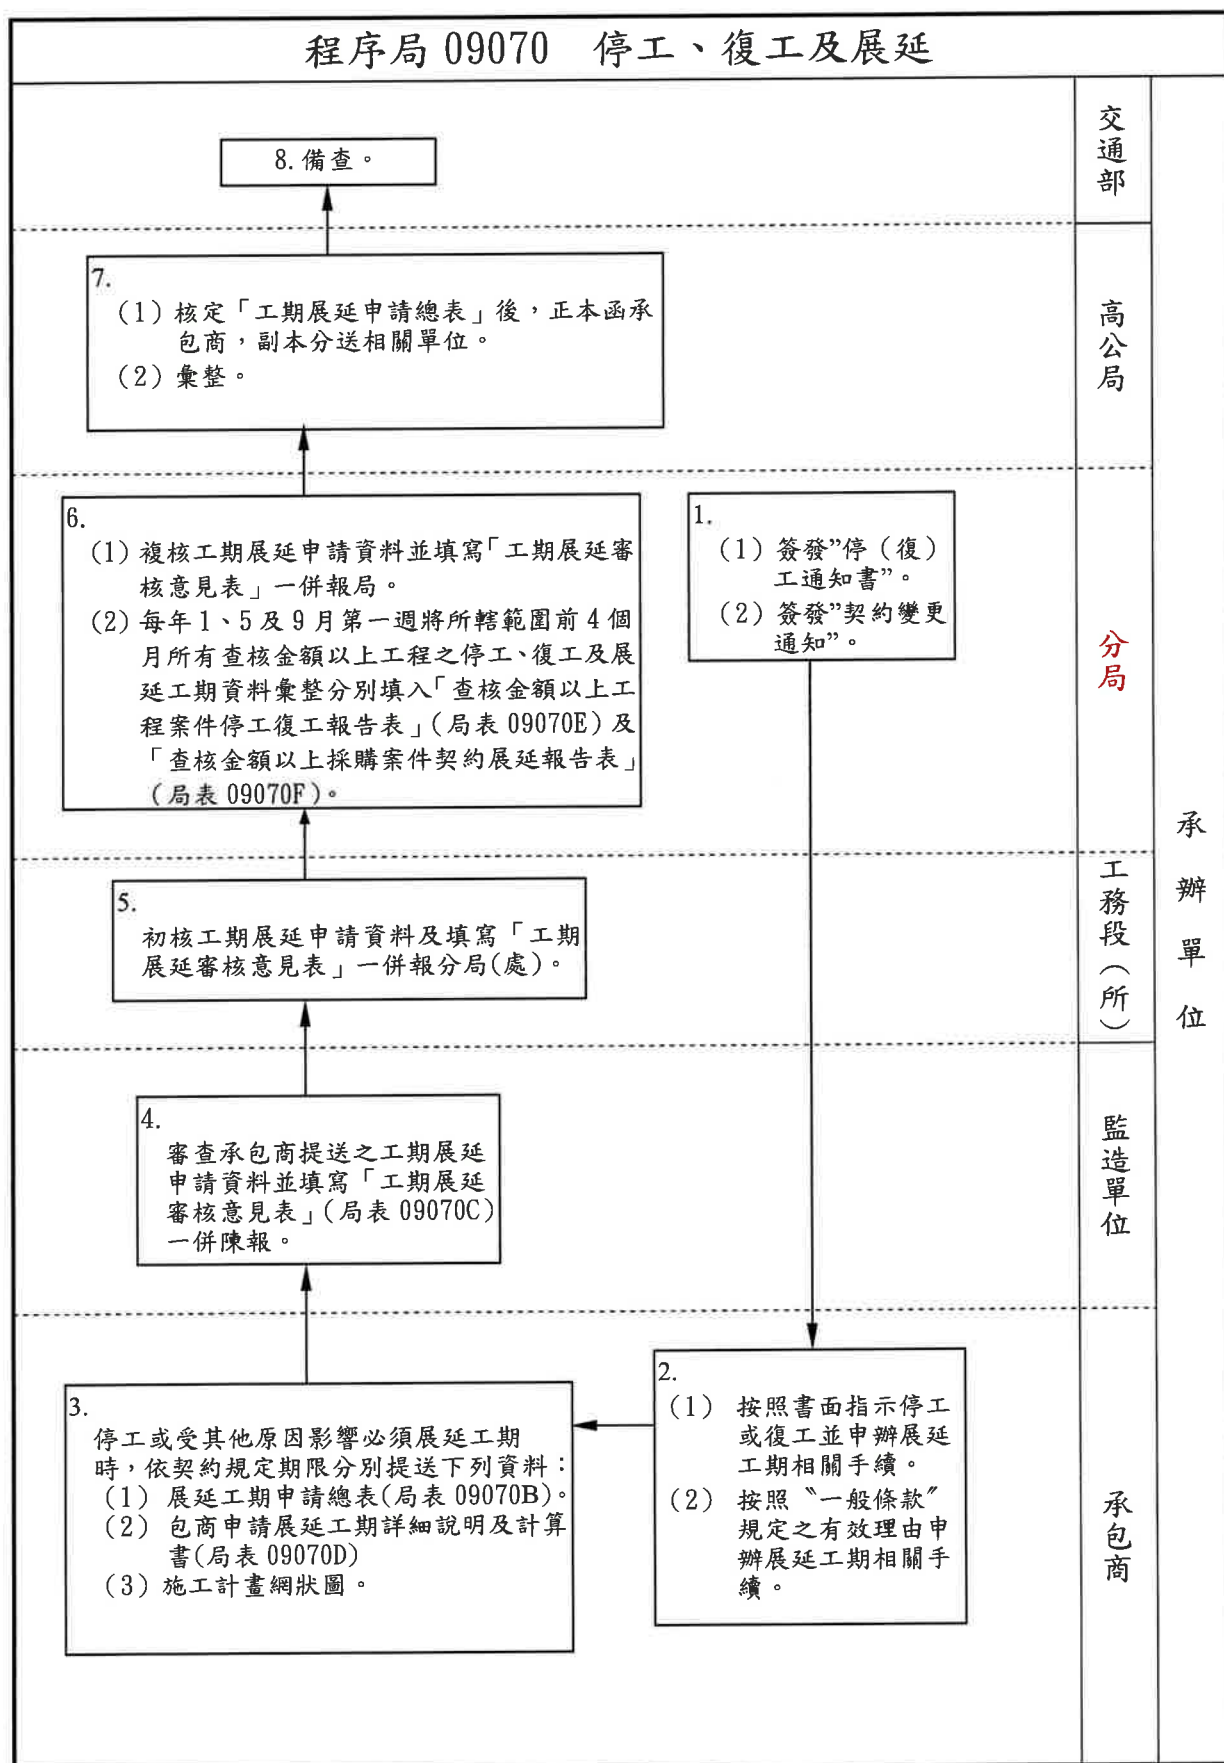



## 交通部高速公路局 工程停工報告表

|  |  |                                |                 |
|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 工 程 名 稱                                      |  |                                |                 |
| 工 程 地 點                                      |  | 契 約 編 號                        |                 |
| 承 包 廠 商                                      |  | 原 契 約 金 額                      |                 |
| 契 約 規 定<br>工 期                               | 天  | 截 至 上 次 止<br>核 定 展 延 後 工 期     | 天               |
| 契 約 規 定<br>開 工 日 期                           | 年      月      日  | 原 契 約 規 定<br>完 工 期 限           | 年      月      日 |
| 實 際<br>開 工 日 期                               |  | 截 至 上 次 止 核 定<br>展 延 後 完 工 期 限 | 年      月      日 |
| 本 次 申 請 停 工 原 因                              |  |                                |                 |
| 預 定 停 工 範 圍                                  |  |                                |                 |
| 預 定 停 工 日 期                                  | 年      月      日  |                                |                 |
| 預 定 復 工 日 期                                  | 年      月      日  |                                |                 |
| 本 次 停 工 是 否 影 響<br>完 工 期 限                   | <input type="checkbox"/> 是，須延長工期 <input type="checkbox"/> 否，無須延長工期 |                                |                 |
| 本 次 核 定<br>停 工 範 圍                           |  |                                |                 |
| 上項工程核定於中華民國      年      月      日正式全面(局部)停工此覆 |  |                                |                 |
| 承 包 廠 商                                      | 監 造 單 位<br>(工程司代表)   | 分 局<br>(工 程 司)                 |                 |
| (技師及專任工程人員簽章)                                |  | (督導工務所)                        | (主辦科)           |
| (公司及公司負責人簽章)                                 |  |                                |                 |

- 一、本表一式 2 份，核定後核定單位及承包廠商各執 1 份，另影印本分送有關單位。
- 二、本次核定停工範圍及日期由核定單位填寫，各欄位不足填寫時，可以增加附頁填寫。





# 交通部高速公路局 工程復工報告表

|  |                    |                                |                 |
|--|--------------------|--------------------------------|-----------------|
| 工 程 名 稱                                      |                    |                                |                 |
| 工 程 地 點                                      |                    | 契 約 編 號                        |                 |
| 承 包 廠 商                                      |                    | 原 契 約 金 額                      |                 |
| 契 約 規 定<br>工 期                               |                    | 截 至 上 次 止<br>核 定 展 延 後 工 期     | 天               |
| 契 約 規 定<br>開 工 日 期                           | 年      月      日    | 原 契 約 規 定<br>完 工 期 限           | 年      月      日 |
| 實 際<br>開 工 日 期                               |                    | 截 至 上 次 止 核 定<br>展 延 後 完 工 期 限 | 年      月      日 |
| 經 核 定 停 工 文 號                                |                    |                                |                 |
| 預 定 復 工 範 圍                                  |                    |                                |                 |
| 預 定 復 工 日 期                                  | 年      月      日    |                                |                 |
| 本 次 核 定<br>復 工 範 圍                           |                    |                                |                 |
| 上項工程核定於中華民國      年      月      日正式全面(局部)復工此覆 |                    |                                |                 |
| 承 包 廠 商                                      | 監 造 單 位<br>(工程司代表) | 分      局<br>(工      程      司)  |                 |
|  |                    | (督導工務所)                        | (主辦科)           |
| (技師及專任工程人員簽章)                                |                    |                                |                 |
| (公司及公司負責人簽章)                                 |                    |                                |                 |

- 一、本表一式2份，核定後核定單位及承包廠商各執1份，另影印本分送有關單位。
- 二、本次核定復工範圍及日期由核定單位填寫，各欄位不足填寫時，可以增加附頁填寫。



# 交通部高速公路局 工期展延申請總表

|                    |        |   |      |   |         |
|--------------------|--------|---|------|---|---------|
| 工 程 名 稱            |        |   |      |   |         |
| 承 包 商              |        |   |      | 契 約 編 號                                     |         |
| 原 契 約 工 期          |        | 截至前次展延核定之契約工期   |      | 規定開工日期                                      |         |
| 申 請 序 次            |        | 本次申請展延天數  |      | 實際開工日期                                      |         |
| 本 次 展 延<br>因 素 概 要 |        |   |      |   |         |
| 歷次展延核定情形           | 序次     | 展延因素概要  | 核准文號 | 展延天數  | 展延後竣工日期 |
|                    | 第 1 次  |   |      | 天   | 年 月 日   |
|                    | 第 2 次  |   |      | 天   | 年 月 日   |
|                    | 第 次    |   |      | 天   | 年 月 日   |
|                    | 第 次    |   |      | 天   | 年 月 日   |
|                    | 第 次    |   |      | 天   | 年 月 日   |
| 本 次 展 延<br>核 定 情 形 |        | 本次核定展延工期為_____日曆天/工作天，展延後工期總計為_____日曆天/工作天。               |      |   |         |
| 備 註                |        |   |      |   |         |
| 承 包 商 簽 章 欄        | 公司印信   | 製表：_____<br>專任工程人員：_____<br>工地主任或負責人：_____<br>公司負責人：_____ |      | 監造單位核章欄<br>審查：_____<br>複核：_____<br>主管：_____ |         |
|                    |        |   |      |   |         |
| 高公局核章欄             | 工務段(所) | 分局  | 工務組  | 局 長   |         |
|                    |        |   |      |   |         |

- 註：1 本表由承包商填列基本資料及用印後併"承包商申請工期展延說明及計算書"及相關附件依序裝訂成冊提送三份送監造單位審查。
2. 各審核單位應於審查竣事填具「工期展延審核意見表」(局表 09070C) 乙份併申請資料依程序陳報。
3. 工期展延奉核定後，由工務組填寫"本次展延核定情形"、"備註"欄及核章後，將申請資料留存一份，餘分送分局及承包商各乙份，另影印"工期展延申請總表"副知有關單位。



局表 09070C  
版本：5 (113.9)

## 交通部高速公路局 工期展延審核意見表

審核單位：\_\_\_\_\_

第\_\_頁 共\_\_頁

|                    |                           |               |        |         |  |
|--------------------|---------------------------|---------------|--------|---------|--|
| 工 程 名 稱            |                           |               |        |         |  |
| 承 包 商              |                           |               |        | 契 約 編 號 |  |
| 原 契 約 工 期          |                           | 截至前次展延核定之契約工期 |        | 規定開工日期  |  |
| 申 請 序 次            |                           | 本次申請展延天數      |        | 實際開工日期  |  |
| 本 次 展 延<br>因 素 概 要 |                           |               |        |         |  |
| 審 核 意 見            | (一) 建議本次展延工期_____日曆天/工作天。 |               |        |         |  |
|                    | (二) 審查意見如后：               |               |        |         |  |
| 核 章 欄              |                           |               |        |         |  |
|                    | 審<br>查                    | 複<br>核        | 主<br>管 |         |  |

版本：5 (113.9)

交通部高速公路局  
工期展延審核意見表（續前頁）

第\_\_頁 共\_\_頁

| 工 程 名 稱          |          |
|------------------|----------|
| 申 請 序 次          | 第      次 |
| 本 次 申 請 展 延 天 數  |          |
| 審<br>核<br>意<br>見 |          |
|                  |          |
|                  |          |
|                  |          |
|                  |          |
|                  |          |

# 交通部高速公路局 承包商申請工期展延說明及計算書

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  
第\_\_\_\_頁 共\_\_\_\_頁

|                     |  |                    |         |                              |     |
|---------------------|--|--------------------|---------|------------------------------|-----|
| 工 程 名 稱             |  |                    |         |                              |     |
| 承 包 商               |  |                    |         | 契 約 編 號                      |     |
| 申 請 序 次             |  | 本 次 申 請 展 延<br>天 數 |         | 截 至 前 次 展 延 核<br>定 之 契 約 工 期 |     |
| 附 件                 |  |                    |         |                              |     |
| 事 實 及 理 由           |  |                    |         |                              |     |
| 施 工 網 圖 作 業 影 響 說 明 | 作 業 編 號  | 作 業 名 稱            | 原 始 時 程 | 延 遲 時 程                      | 說 明 |
|                     |  |                    |         |                              |     |
| 承 包 商 簽 章 欄         | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">製<br/><br/>表</div> <div style="text-align: center;">工<br/>地<br/>主<br/>任<br/>或<br/>負<br/>責<br/>人</div> <div style="text-align: center;">專<br/>任<br/>工<br/>程<br/>人<br/>員</div> </div> |                    |         |                              |     |

局表 09070D  
版本：5 (113.9)

交通部高速公路局  
承包商申請工期展延說明及計算書  
(續前頁)

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

第\_\_\_\_頁 共\_\_\_\_頁

| 工 程 名 稱     |            |                                      |                            |                              |  |
|-------------|------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| 申 請 序 次     |            | 本 次 申 請 展 延<br>天 數                   |                            | 截 至 前 次 展 延 核<br>定 之 契 約 工 期 |  |
| 計 算         |            |                                      |                            |                              |  |
|             |            |                                      |                            |                              |  |
| 承 包 商 簽 章 欄 | 製<br><br>表 | 工<br>地<br>主<br>任<br>或<br>負<br>責<br>人 | 專<br>任<br>工<br>程<br>人<br>員 |                              |  |







交通部高速公路局  
查核金額以上採購案件契約展延報告表

填報單位：\_\_\_\_\_ 資料時間：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月至\_\_\_\_年\_\_\_\_月 第\_\_\_\_頁 共\_\_\_\_頁

| 案號 | 契約名稱 | 原契約工期<br>(日曆天) |    | 截至上次展<br>延後契約完<br>工期限<br>(日曆天) |    | 本次核定延<br>長工期<br>(日曆天) |    | 本次展延後<br>契約完工期<br>(日曆天) |    | 展延次<br>別 | 工期展延原因 | 契約依據 |
|----|------|----------------|----|--------------------------------|----|-----------------------|----|-------------------------|----|----------|--------|------|
|    |      | 日期             | 工期 | 日期                             | 工期 | 日期                    | 工期 | 日期                      | 工期 |          |        |      |
|    |      |                |    |                                |    |                       |    |                         |    |          |        |      |
|    |      |                |    |                                |    |                       |    |                         |    |          |        |      |
|    |      |                |    |                                |    |                       |    |                         |    |          |        |      |
|    |      |                |    |                                |    |                       |    |                         |    |          |        |      |
|    |      |                |    |                                |    |                       |    |                         |    |          |        |      |
|    |      |                |    |                                |    |                       |    |                         |    |          |        |      |
|    |      |                |    |                                |    |                       |    |                         |    |          |        |      |

註：1. 屬院列管案件，若標案展延致影響計畫工期者，應專案報交通部轉行政院核定；屬部列管案件，若標案展延致影響計畫工期者，應專案報交通部核定。  
2. 工程、勞務案件請分開填列，並將巨額案件優先。  
3. 本表應於每1,5,9月於規定時程前送本局以憑彙整報部。



交通部高速公路局  
工程停（復）工通知書

檔 號：  
保存年限：

交通部高速公路局○○○分局 函

機關地址：  
承辦人：○○○  
聯絡電話：  
電子信箱：

受文者：

發文日期：  
發文字號：  
速別：  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

裝

主旨：貴公司承辦○○○○○○工程（契約編號：○○○○○○），自民國  
○○○年○月○日停（復）工，請查照。

說明：

訂

正本：○○○○（得標廠商）  
副本：高速公路局、本分局主計室、政風室、工務科、督導工務段（所）、監造顧問公司

分局長 ○ ○ ○

線

